AES-021 NEW COUPLER INSTALLATION CP3C96
05/19/15 LUIS, MARK, MARCO.

ACTIVE PUMPING

INSIDE MKS – 2.00×10^{-7} TORR

OUTSIDE CC – 5.57×10^{-8} TORR

OUTSIDE MKS – 8.30×10^{-8} TORR

LD – 1.9×10^{-10} MBAR L/S

START SPRAY – 9:12 1.8×10^{-10} MBAR L/S

STOP SPRAY – 9:14 1.8×10^{-10} MBAR L/S.

END TEST – 9:20 1.8×10^{-10} MBAR L/S.
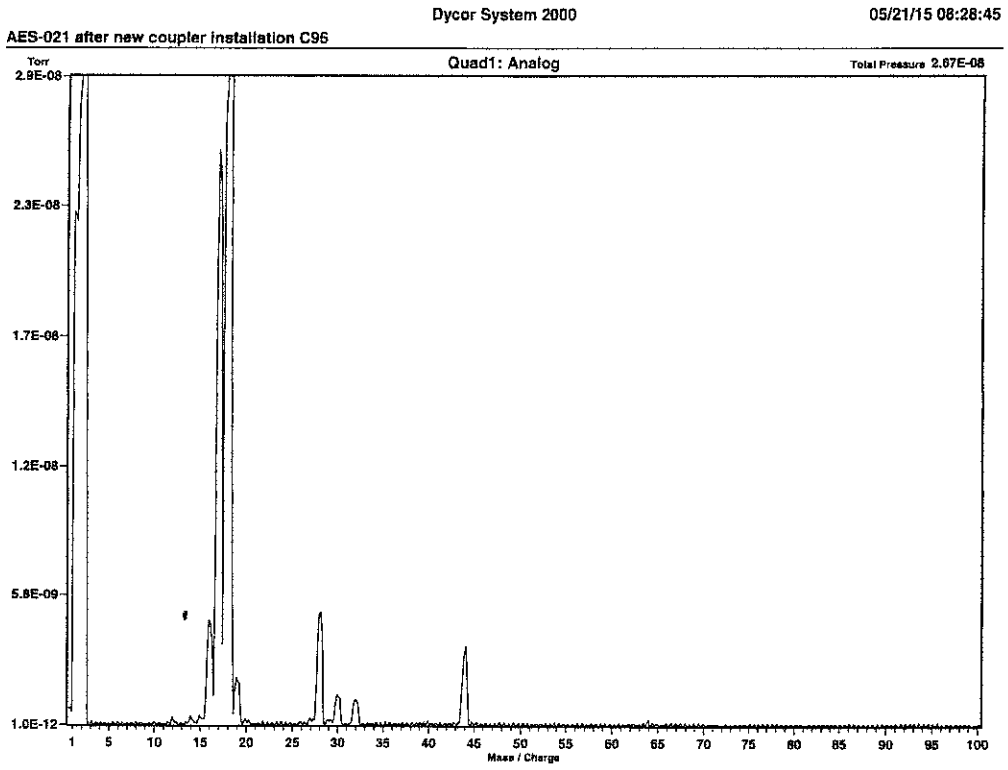
* RESULTS: NO RESPONSE TO HELIUM
